


渋谷駅街区土地区画整理事業
工事進捗状況
(H25.10)

その1

渋谷駅東口基盤整備工事 全体写真
(平成25年10月18日撮影)

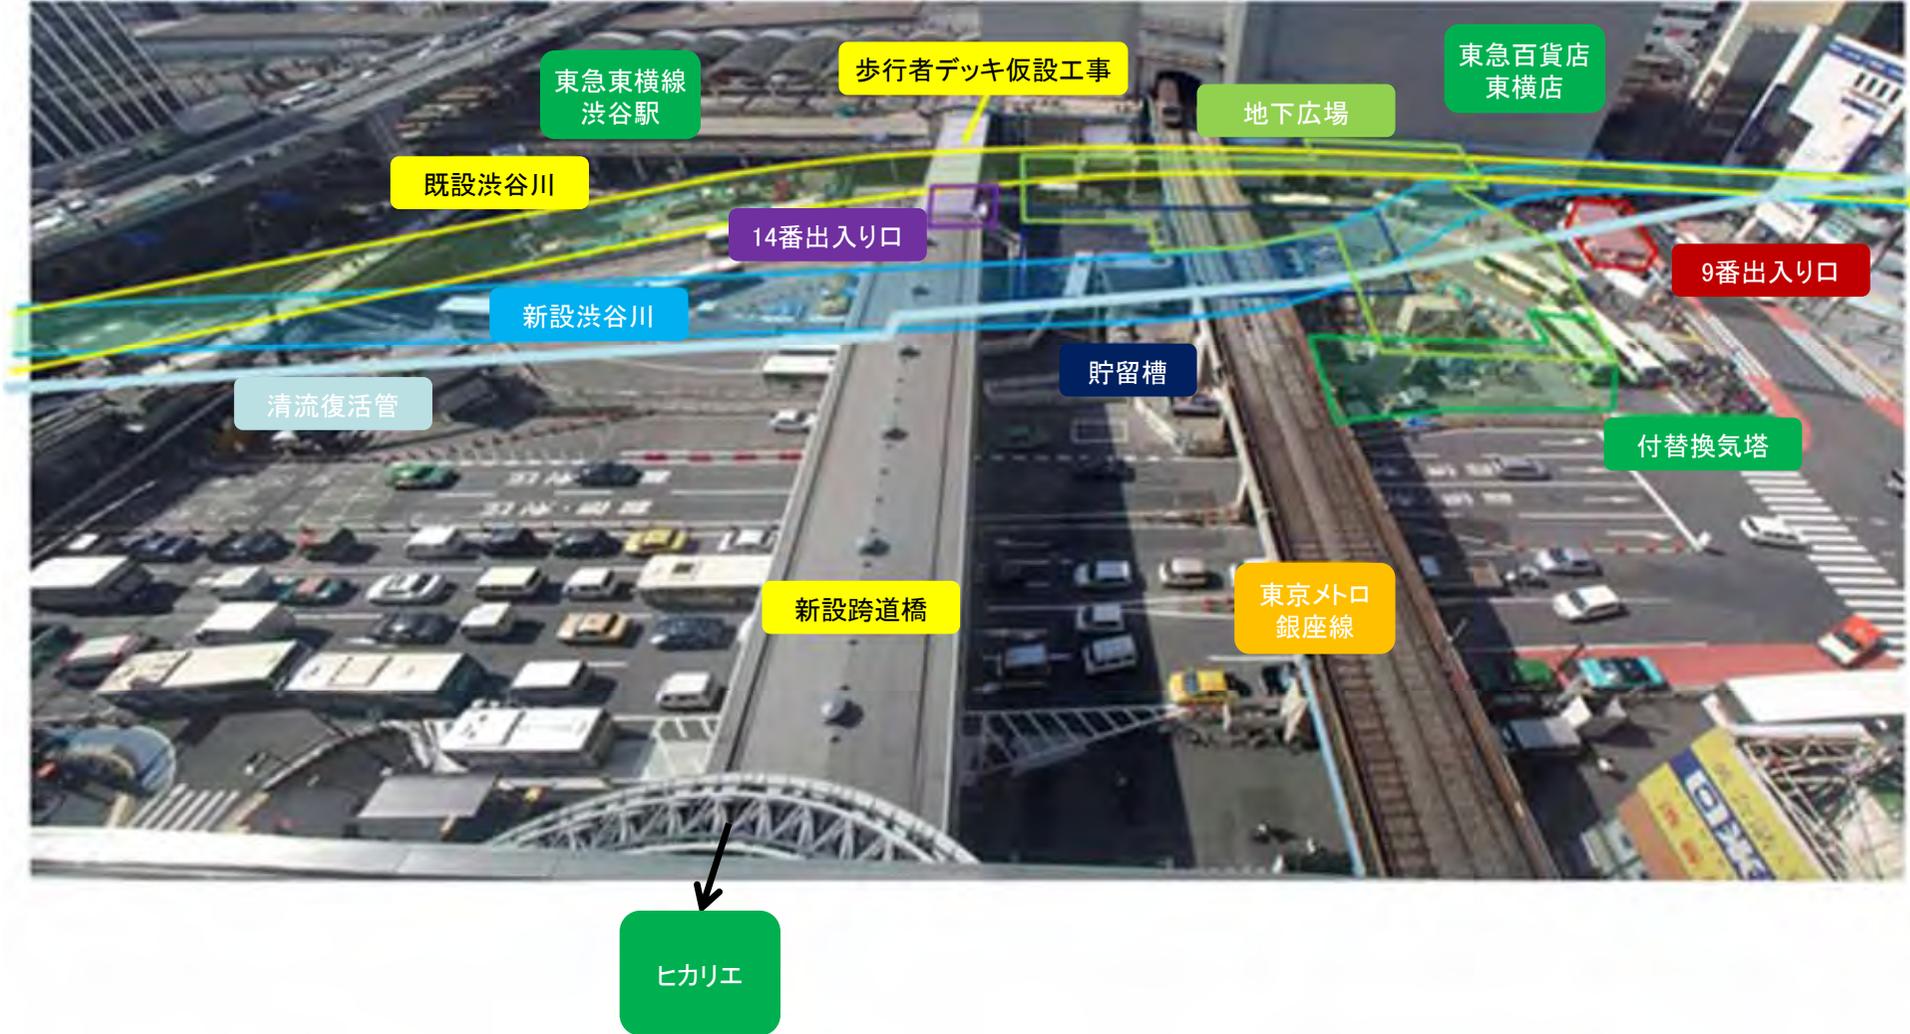

渋谷駅街区土地区画整理事業に伴う
渋谷駅東口基盤整備工事(第1工区)


3ヶ月間予定工程表

平成25年 10月 1日 ~ 平成25年 12月31日



番号	工 種	10月			11月			12月			備 考			
		1	10	20	30	1	10	20	31	1		10	20	30
	躯体構築工事 (付替換気塔)	[Blue bar spanning from Oct 1 to Dec 31]												東口地下広場に支障となる既設換気塔を移設する工事です。新設躯体を構築した後、既設換気塔を撤去していきます。
	嵩上盛土、路面 覆工工事	[Yellow bar spanning from Oct 1 to Nov 15]												広場の道路高さを少しずつ上げていきます。その後覆工を広場全面に架設します。
	掘削・土留支保 工工事	[Yellow bar spanning from Oct 15 to Dec 31]												路面覆工架設を行ったところから、順次路下の掘削を進めていきます。 以降継続
	構造物解体工事 (旧9番・14番出入口)	[Green bar spanning from Nov 15 to Dec 31]												地下部に残っている旧9番出入口、14番出入口を覆工の下で壊していく工事です。 以降継続

施工箇所説明写真 渋谷駅東口基盤整備工事(第1工区)

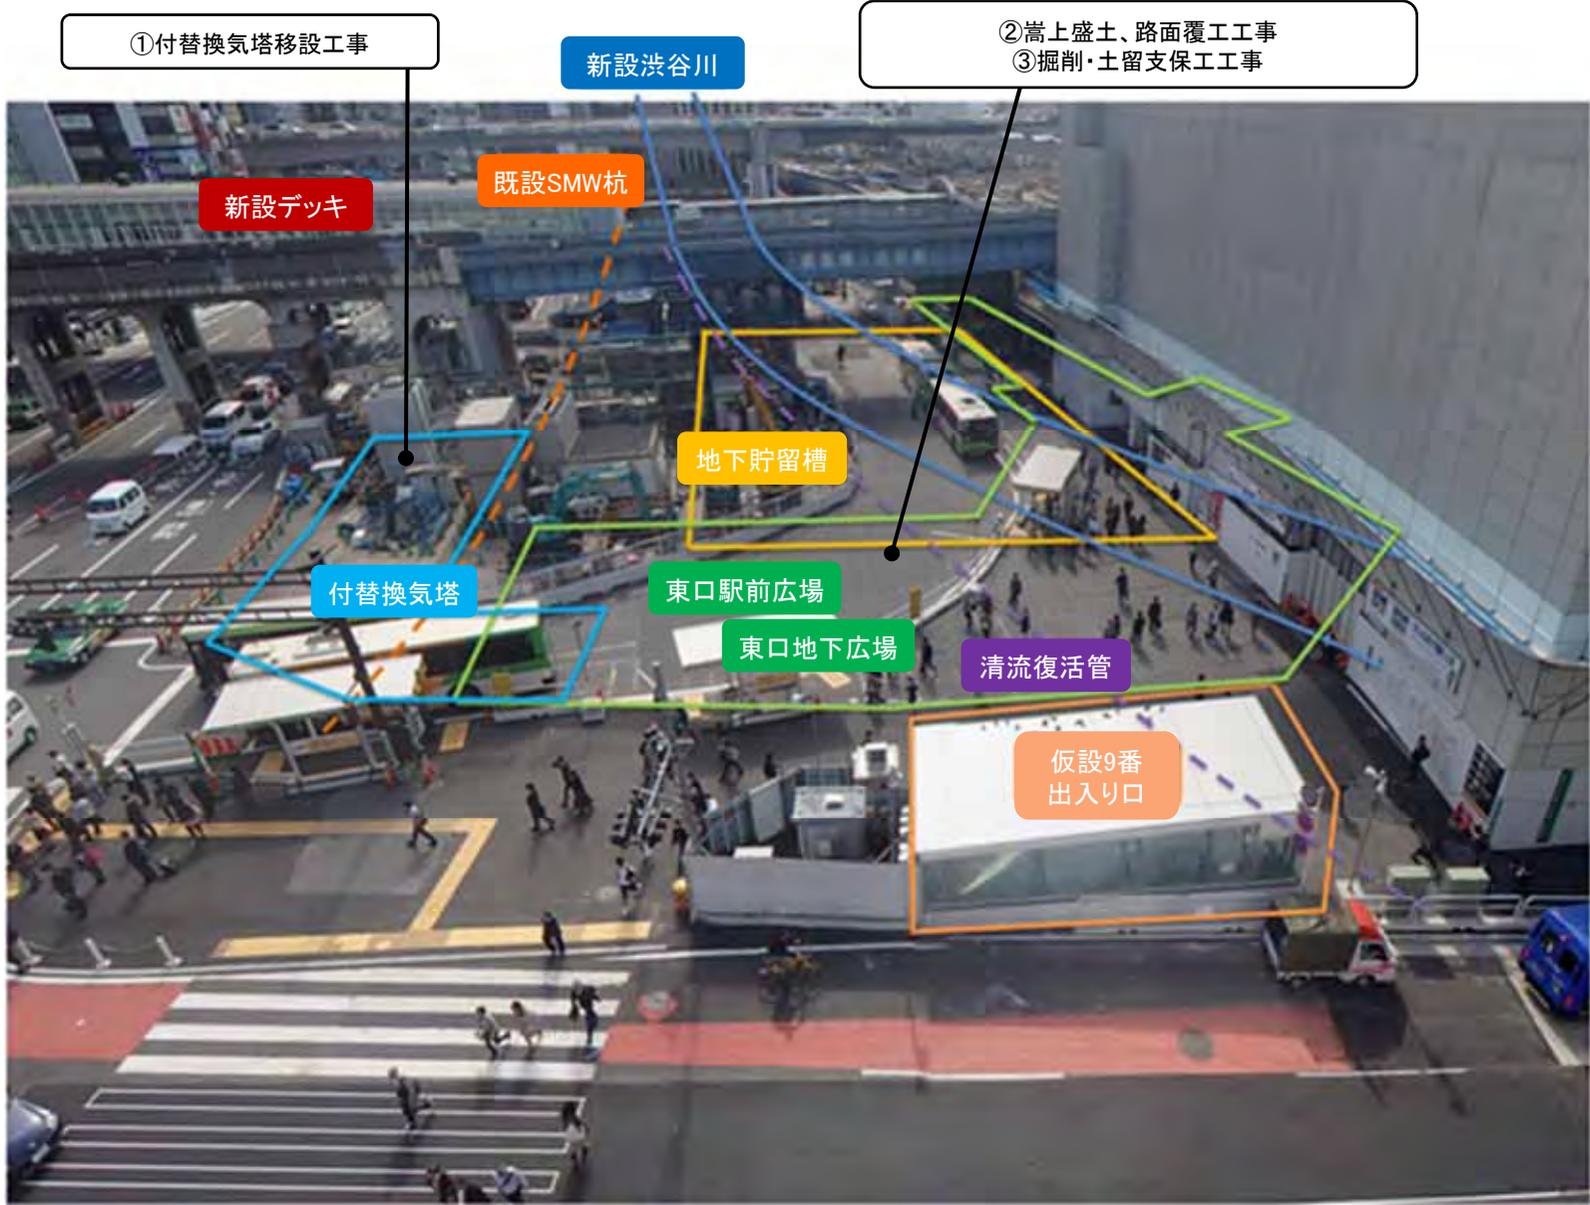

現場進捗写真(平成25年10月)
渋谷駅東口基盤整備工事(第1工区)

①東口バスロータリー全景(北側 H25.7中旬)



②東口バスロータリー全景(北側 H25.10中旬)



現場進捗写真(平成25年10月)
渋谷駅東口基盤整備工事(第1工区)

③付替換気塔構築 地上部構築完了



現場進捗写真(平成25年10月)
渋谷駅東口基盤整備工事(第1工区)

④付替換気塔構築 構内の状況



現場進捗写真(平成25年10月)
渋谷駅東口基盤整備工事(第1工区)

⑤路面覆工 施工状況



現場進捗写真(平成25年10月)
渋谷駅東口基盤整備工事(第1工区)

⑥一次掘削状況

