






渋谷駅街区土地区画整理事業に伴う  
渋谷駅西口地下タクトールインアウト車路整備工事

令和8年2月度 月間予定工程表

施工者 東急・大成建設共同企業体  
渋谷基盤整備工事事務所

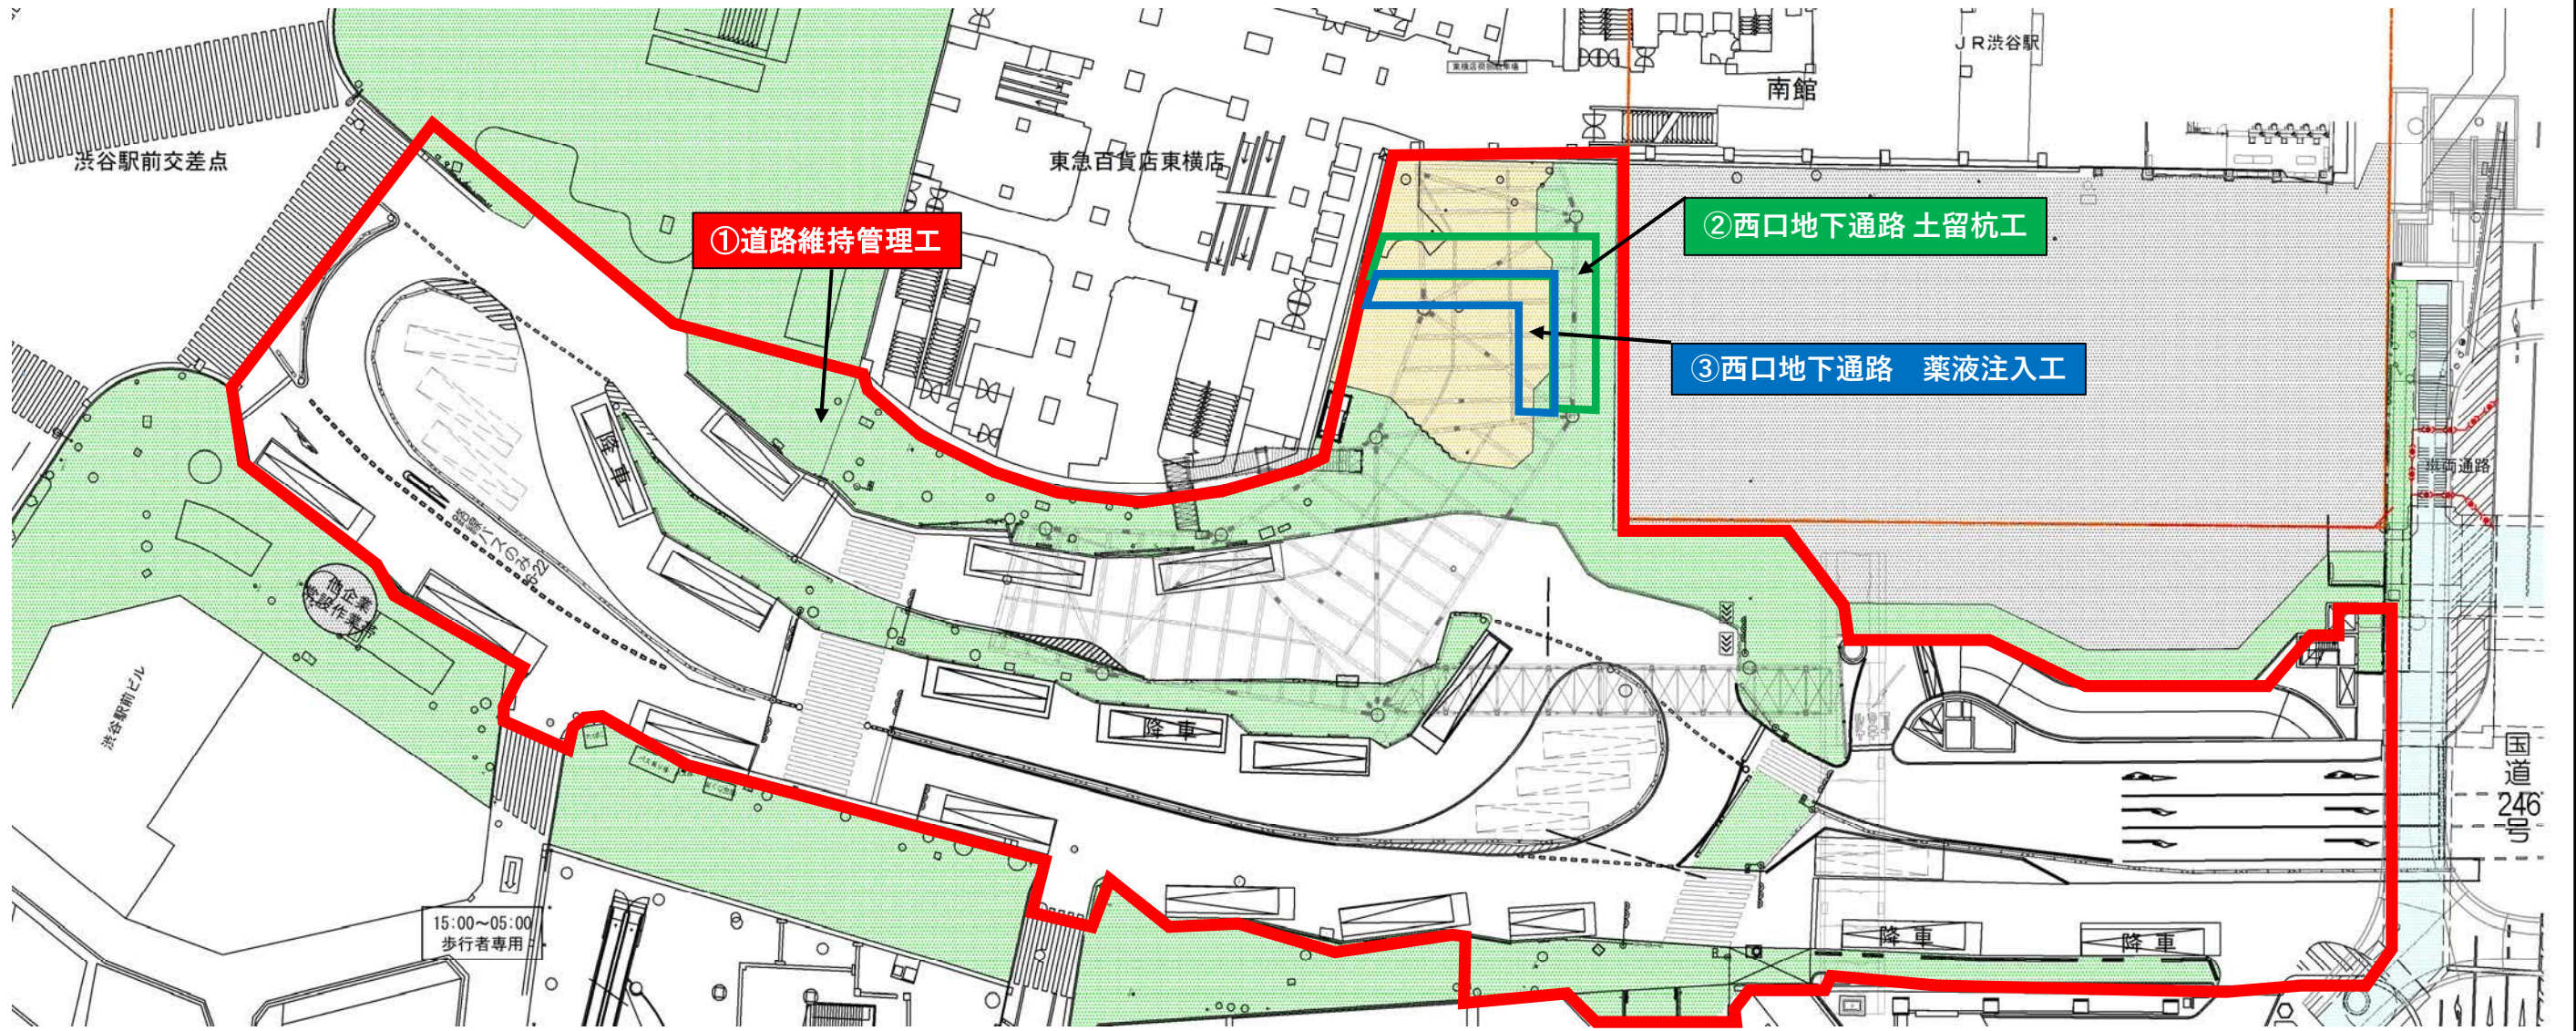

番号	工 種	2月						備 考
		1	5	10	15	20	25	
①	道路維持管理工							西口駅前広場の道路維持管理を行う工事です。
②	西口地下通路 土留杭工							地下通路躯体構築のための土留杭を打設する工事です。
③	西口地下通路 薬液注入工							掘削工事の際に影響する地下水の侵入を抑えるため土留杭背面の地盤を改良する工事です。
